


ニューマチックケーソン年度毎実績表

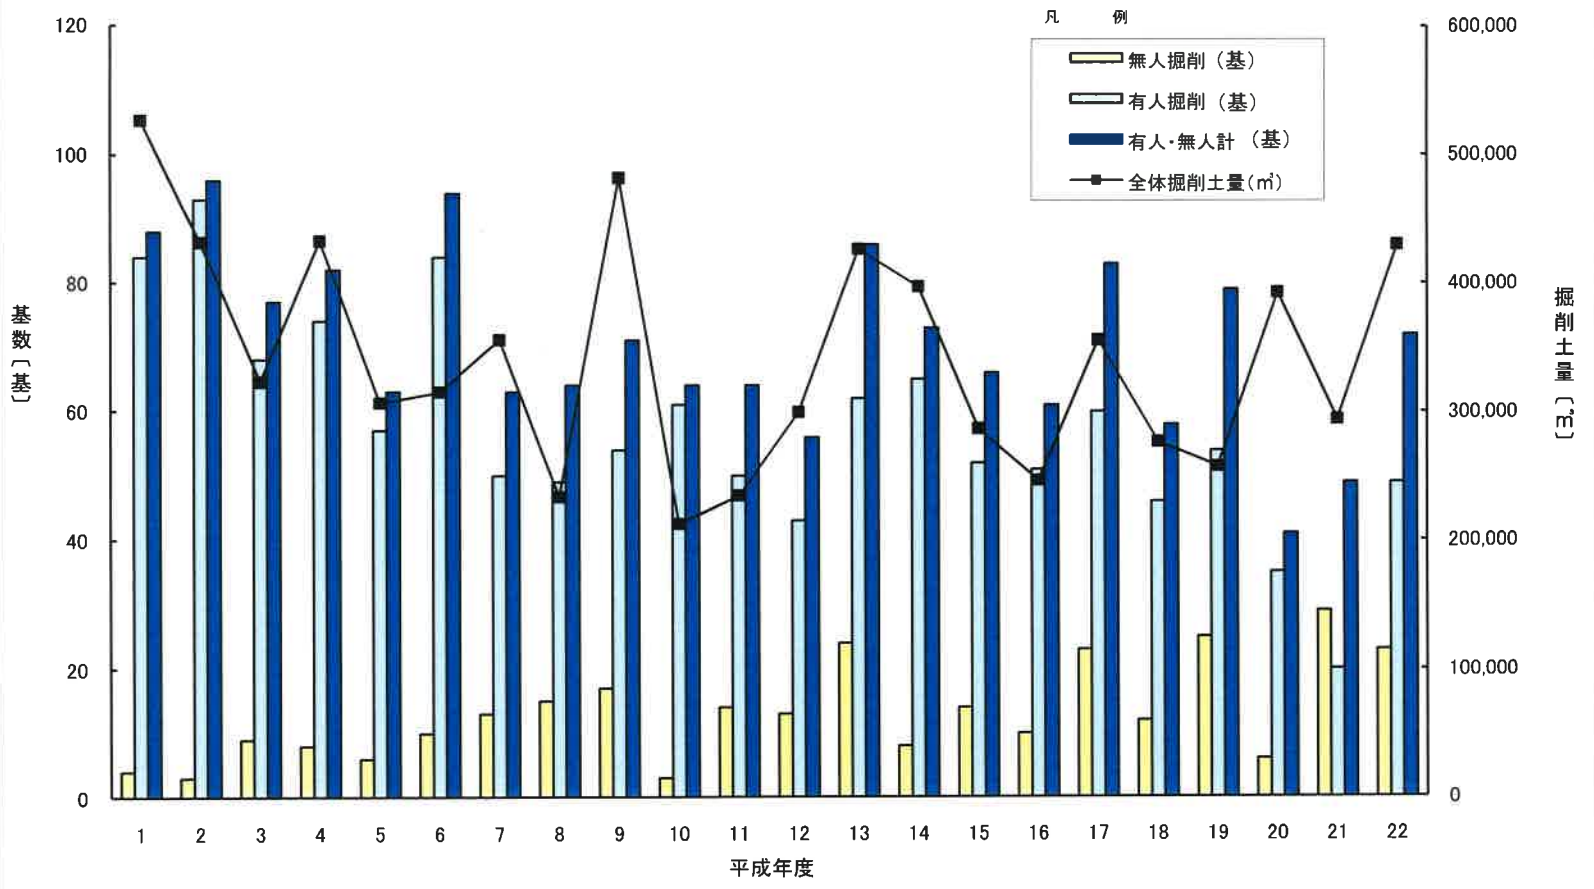

ニューマチックケーソン有人・無人実績表

年度	掘削基数			全体掘削土量(m³)
	無人掘削	有人掘削	有人・無人計	
1	4	84	88	526,500
2	3	93	96	431,500
3	9	68	77	322,500
4	8	74	82	432,800
5	6	57	63	306,400
6	10	84	94	314,900
7	13	50	63	355,500
8	15	49	64	233,300
9	17	54	71	481,900
10	3	61	64	212,400
11	14	50	64	234,300
12	13	43	56	299,400
13	24	62	86	426,400
14	8	65	73	397,100
15	14	52	66	286,600
16	10	51	61	246,300
17	23	60	83	355,421
18	12	46	58	276,532
19	25	54	79	257,314
20	6	35	41	392,606
21	29	20	49	293,982
22	23	49	72	429,950
累計	289	1,261	1,550	7,513,605

※無人とは、有人掘削と無人掘削の併用である。ただし、有人から無人掘削への切替圧力は、平均して0.14~0.18MPaである。
