


ニューマチックケーソン年度毎実績表

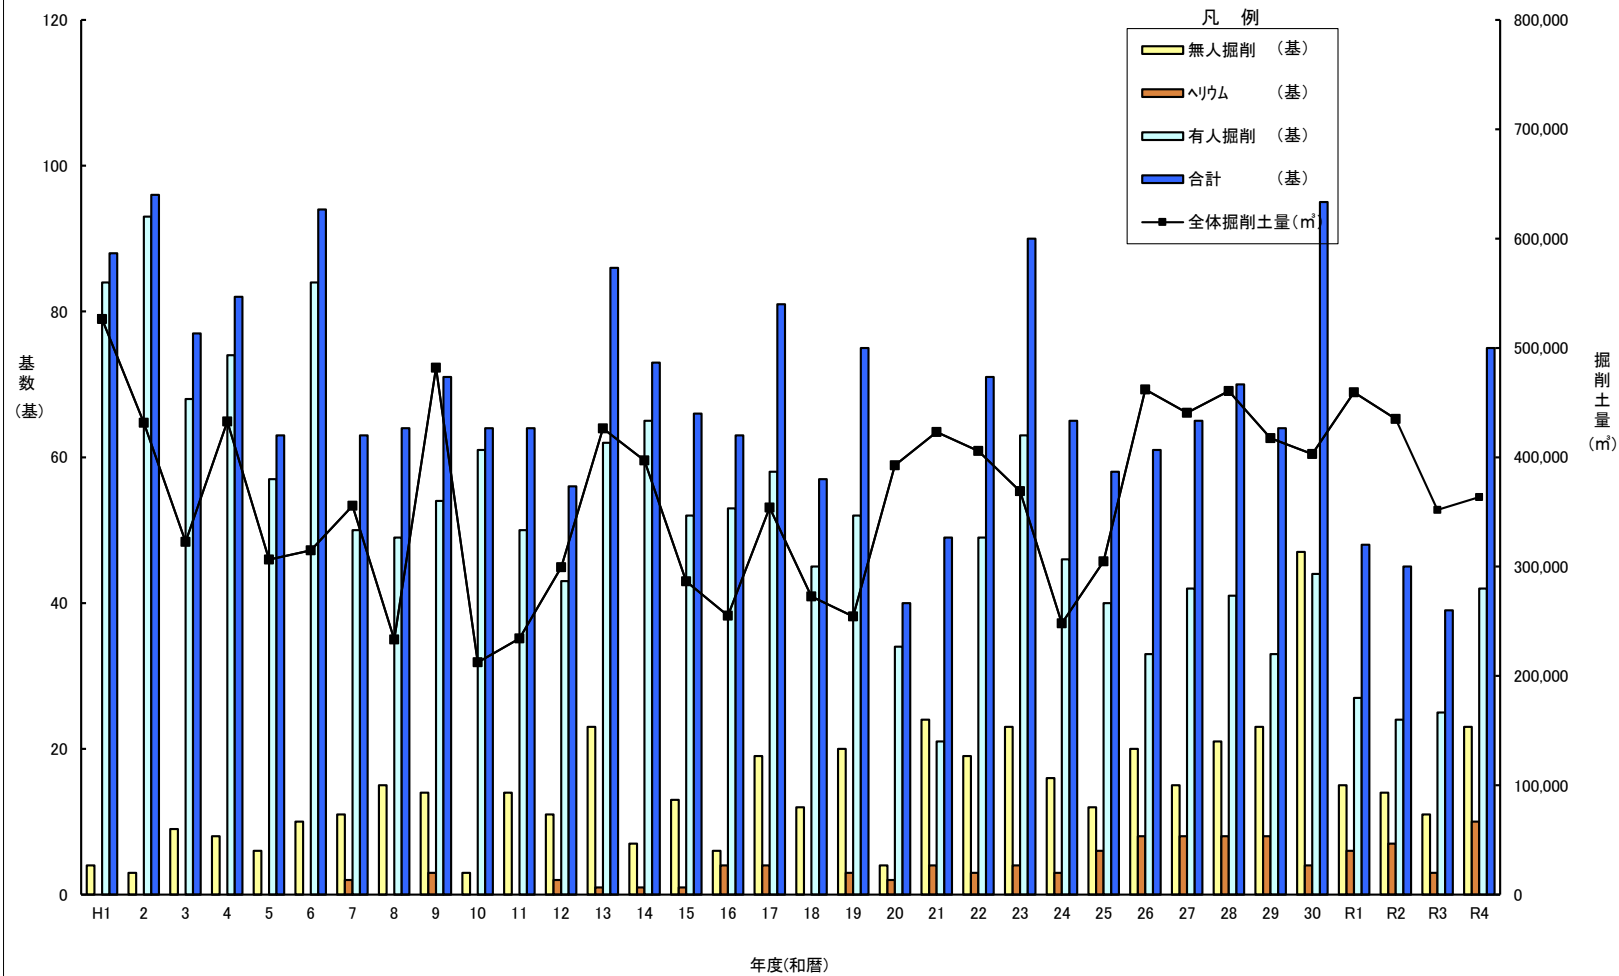

※無人とは、有人掘削と無人掘削の併用である。ただし、有人から無人掘削への切替圧力は、平均して0.14～0.18MPaである。

※ヘリウムとは、ヘリウム混合ガス使用の無人化ニューマチックケーソンである。

ニューマチックケーソン有人・無人実績表

年度	掘 削 基 数				全体掘削土量(m³)
	無人掘削	ヘリウム	有人掘削		
H1	4	0	84	88	526,500
2	3	0	93	96	431,500
3	9	0	68	77	322,500
4	8	0	74	82	432,800
5	6	0	57	63	306,400
6	10	0	84	94	314,900
7	11	2	50	63	355,500
8	15	0	49	64	233,300
9	14	3	54	71	481,900
10	3	0	61	64	212,400
11	14	0	50	64	234,300
12	11	2	43	56	299,400
13	23	1	62	86	426,400
14	7	1	65	73	397,100
15	13	1	52	66	286,600
16	6	4	53	63	255,200
17	19	4	58	81	354,000
18	12	0	45	57	272,600
19	20	3	52	75	254,300
20	4	2	34	40	392,600
21	24	4	21	49	423,175
22	19	3	49	71	405,675
23	23	4	63	90	369,002
24	16	3	46	65	248,121
25	12	6	40	58	304,716
26	20	8	33	61	461,920
27	15	8	42	65	440,534
28	21	8	41	70	460,627
29	23	8	33	64	417,553
30	47	4	44	95	402,845
R1	15	6	27	48	459,470
R2	14	7	24	45	435,076
R3	11	3	25	39	351,926
R4	23	10	42	75	363,540
累計	461	92	1,651	2,204	11,618,914

日本圧気技術協会 実績データより
